


令和8年2月通常会議 施設常任委員会資料

議案第49号

工事委託契約の変更について (大津市道幹2028号線道路整備工事の 工事委託契約の一部変更)

令和8年3月16日(月)
建設部 道路建設課

1. 位置図

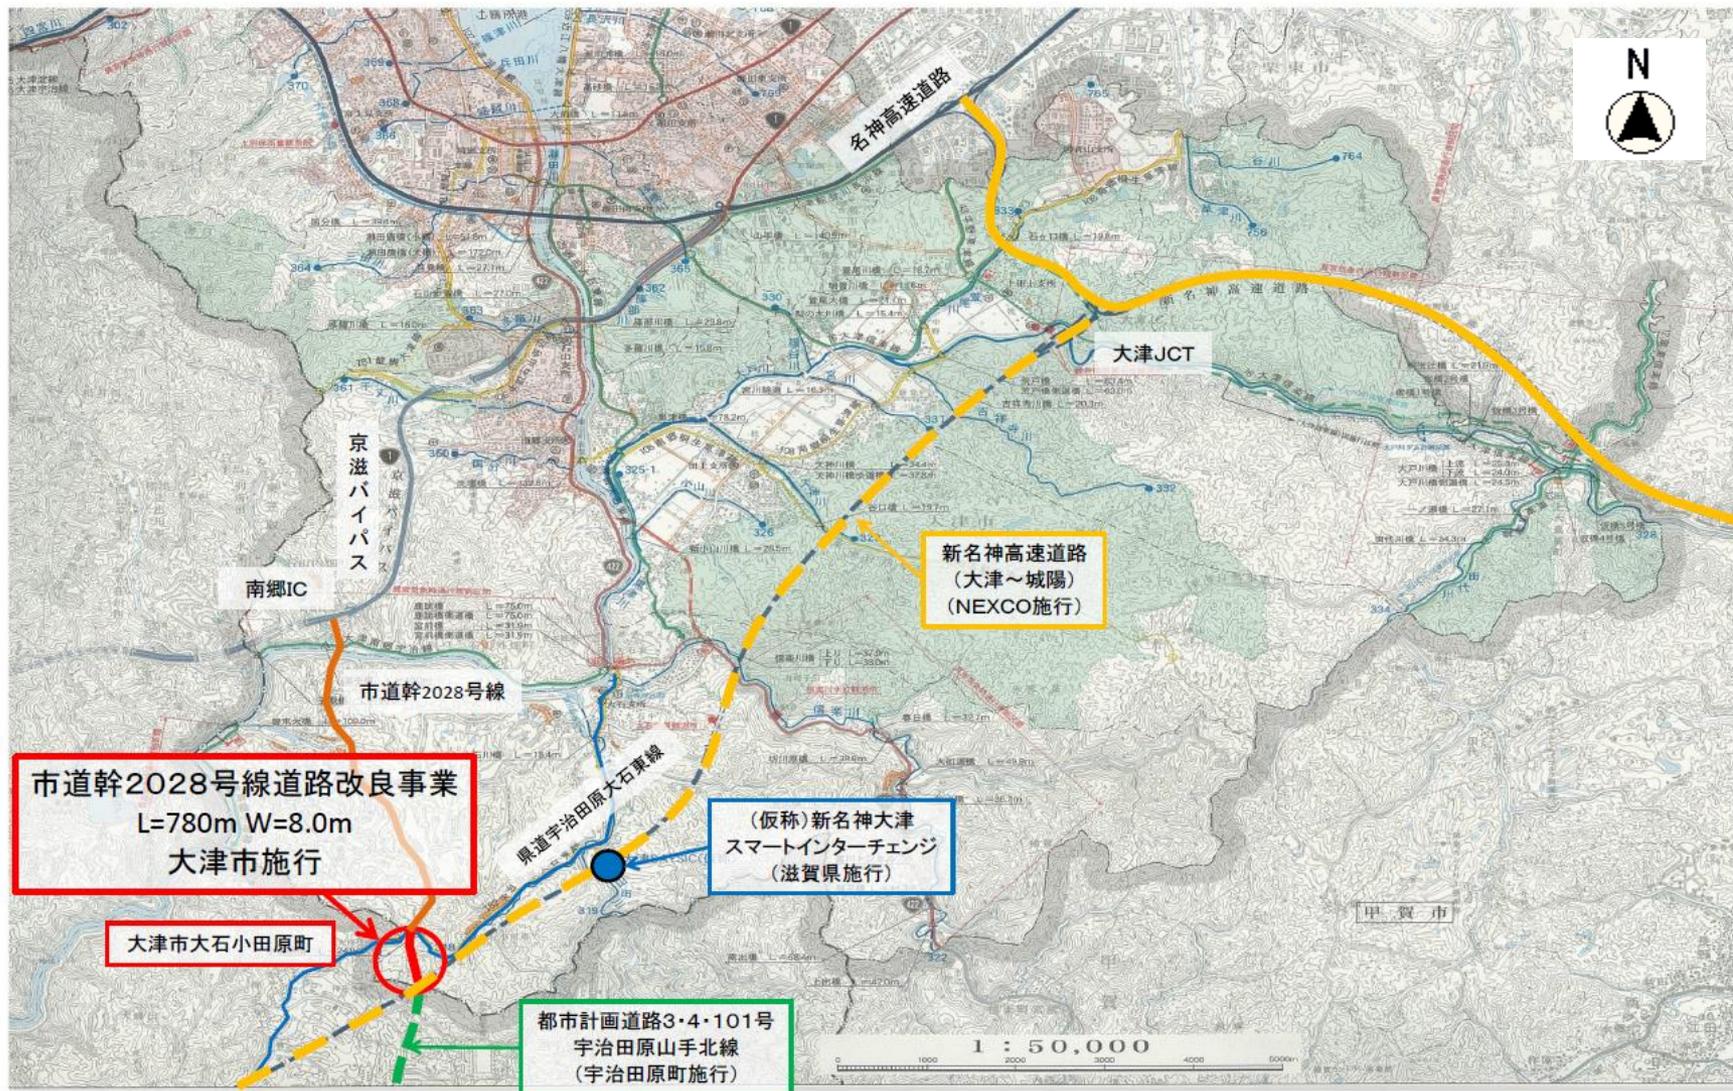

2. 委託内容

西日本高速道路株式会社に工事委託をしている大津市道幹2028号線道路整備工事について、工事委託契約の一部を変更するもの


- | | |
|------------|--|
| 1. 委託契約の名称 | 大津市道幹2028号線道路整備工事 |
| 2. 委託契約の場所 | 大津市大石小田原町 |
| 3. 契約の相手方 | 西日本高速道路株式会社 |
| 4. 契約金額 | 1, 113, 495, 000円（現在）
1, 613, 495, 000円（変更）（+500, 000千円） |
| 5. 委託契約の内容 | 道路整備工事（施工延長780m）
道路土工…一式、排水構造物工…一式、擁壁工…一式、
法面工…一式、仮設工…一式 |
| 6. 委託契約の期間 | 令和2年7月2日から令和8年3月31日まで（現在）
令和2年7月2日から令和10年3月31日まで（変更） |

2. 委託内容


西日本高速道路株式会社に工事委託をしている大津市道幹2028号線道路整備工事について、工事委託契約の一部を変更するもの

- | | |
|---------|--|
| 7. 契約方法 | 随意契約 |
| 8. 変更理由 | 西日本高速道路株式会社が近隣で実施する新名神高速道路整備事業工事の工期が延長されたことに伴い、本市が行う予定である大津市道幹2028号線の道路改良工事の施行箇所の一部を追加するため |
| 9. 備考 | 令和7年11月通常会議にて、令和8・9年度の債務負担行為（500,000千円）の設定について議決済 |


3. 平面図

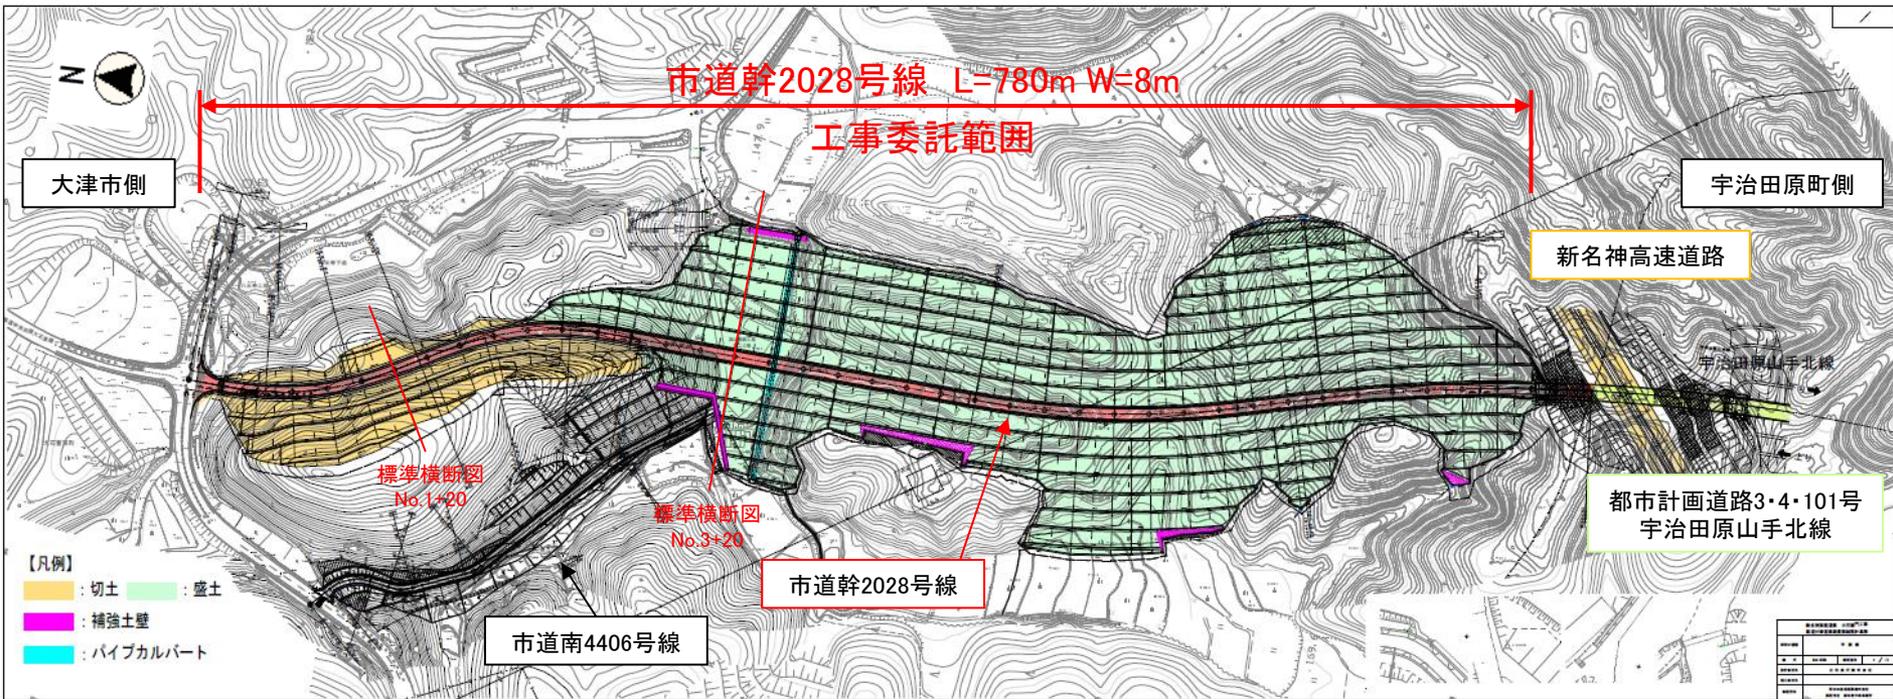

4. 標準横断面図

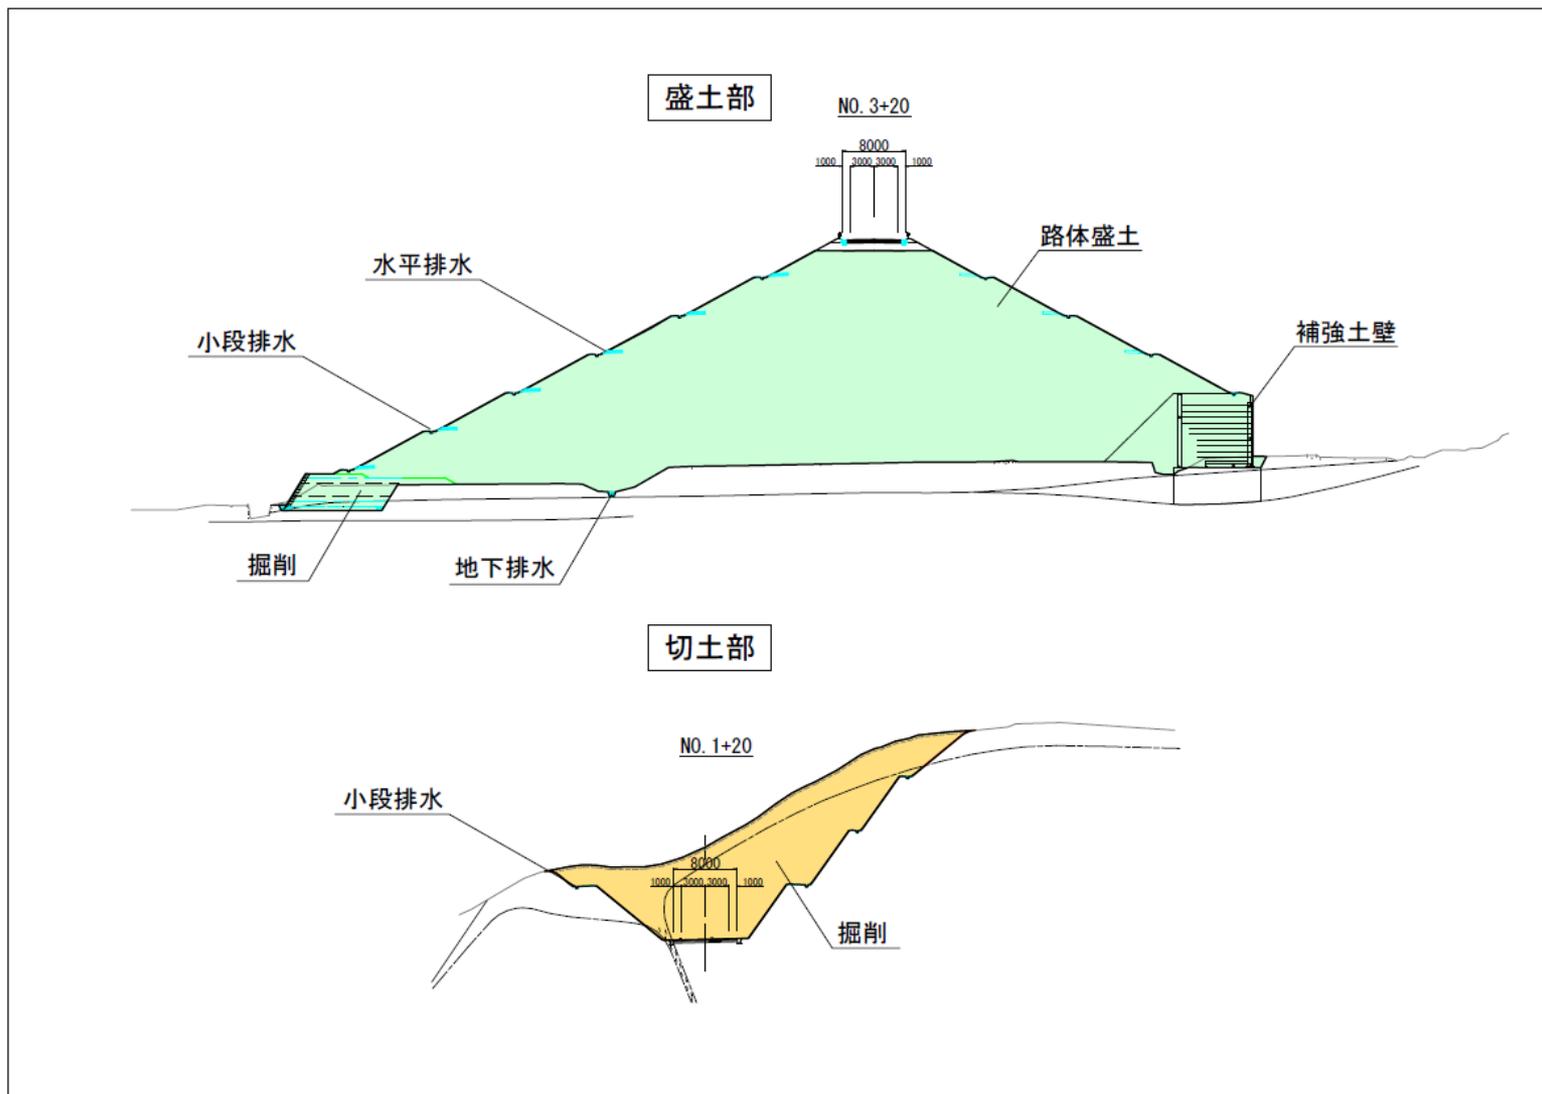

5. 縦断図

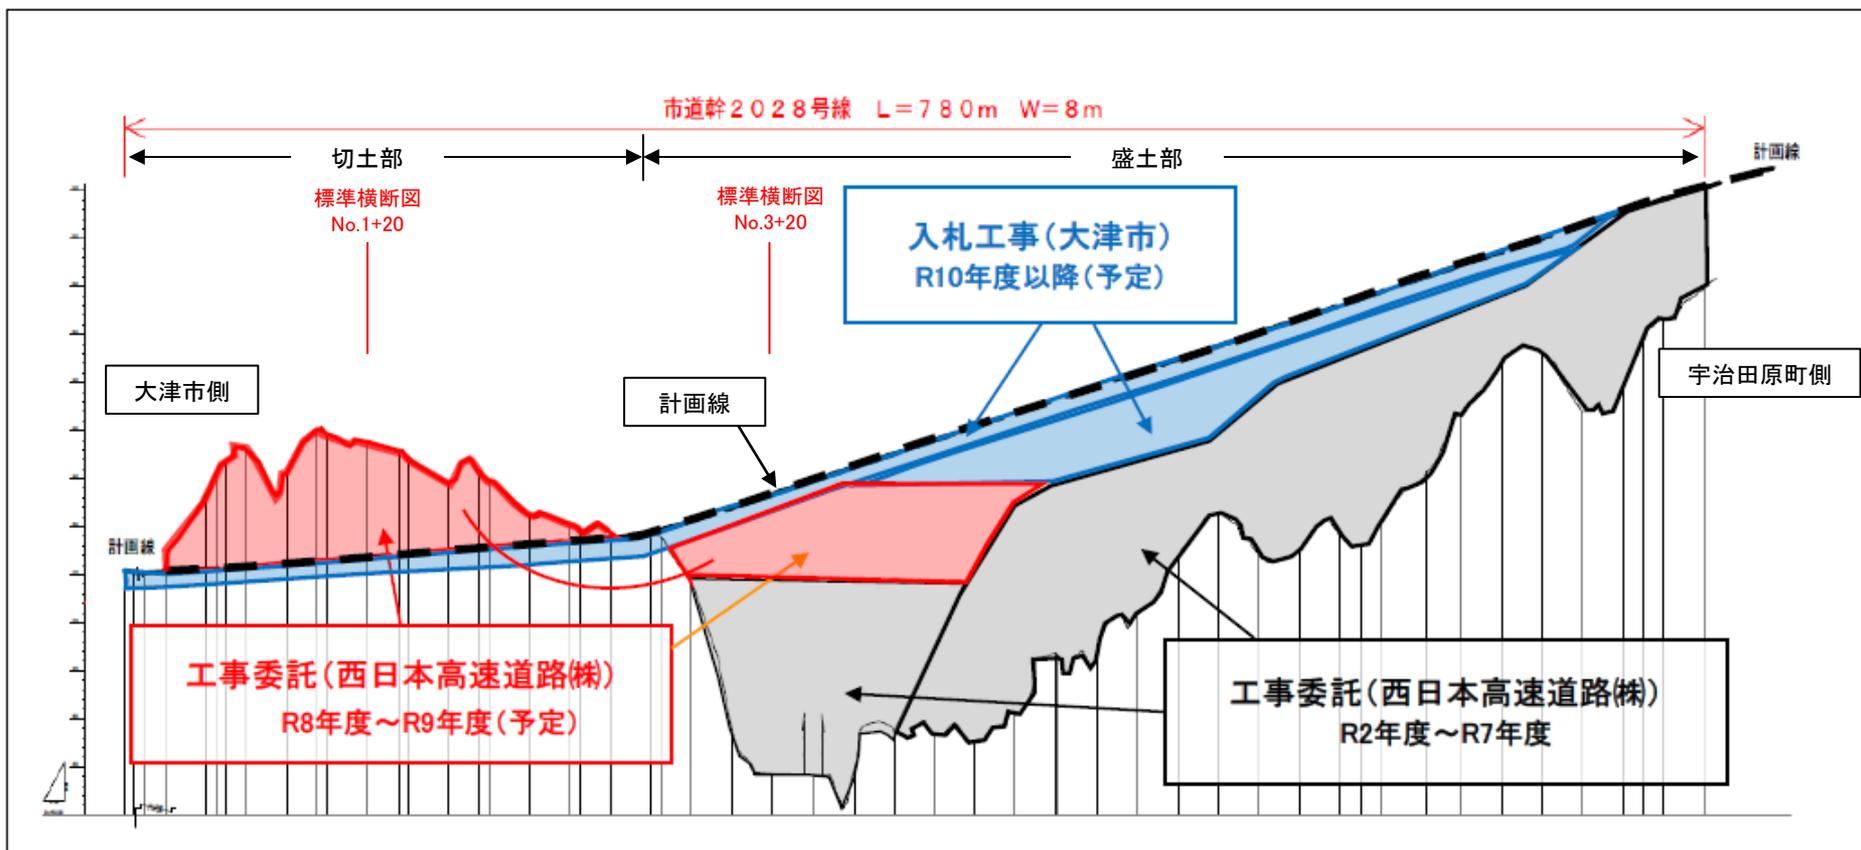



6. 現況写真





7. 工事委託契約の経過

No.	基本協定	締結日	議決日	協定期間	協定金額	変更内容	新名神高速道路整備事業の施工期間
①	当初	令和2年5月19日	令和2年7月2日	令和5年3月31日	795,000,000	-	-
							R3.12.27 R5年度からR6年度の開通予定に延期
②	第1回変更	令和4年12月23日	令和5年3月24日	令和7年3月31日	1,113,495,000	協定金額・協定期間・協定範囲	-
③	第2回変更	令和6年3月29日	-	令和7年3月31日	1,113,495,000	協定範囲	-
							R6.12.24 R6年度からR10年度の開通予定に延期 (工事進捗により、さらに1~2年程度延長)
④	第3回変更	令和7年2月13日	-	令和8年3月31日	1,113,495,000	協定期間	-
⑤	第4回変更	令和7年12月23日	令和8年2月議会	令和10年3月31日	1,613,495,000	協定金額・協定期間	



①当初

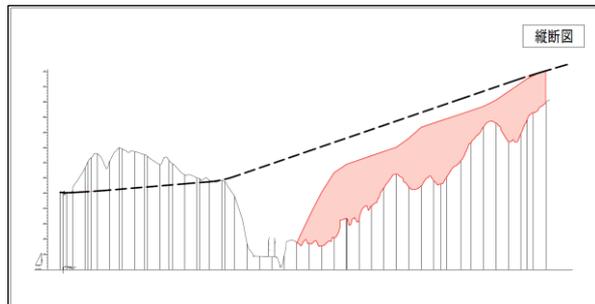

②第1回変更

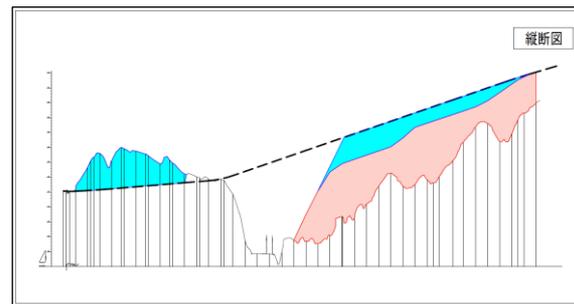

③第2回変更

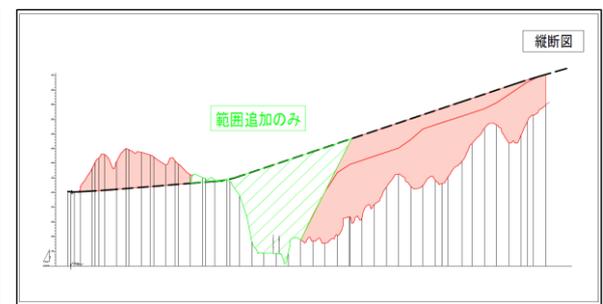

8. 全体工事スケジュール(予定)

路線名	工事	施行者	内容	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降
幹 2 0 2 8 号 線	入札工事	大津市	準備工 (樹木伐採・仮設道路)	→									
	工事委託	西日本高速道路(株)	道路土工、法面工 擁壁工、排水構造物工等		→								
	入札工事	大津市	道路土工、法面工、 排水構造物工、舗装工等										→

工事委託契約
の変更

※破線=予定
