


(様式第5号)

[illegible]

(様式第5号)

工程表			【計画】□当初 □変更(第 回)		工事名		〇〇〇〇市民センター新築機械設備工事												契約 工期	【着手】 自／令和3年6月1日																																																																			
			【実施】■令和3年7月		工事場所		大津市 〇〇〇〇						受注者(会社名)							【完了】 至／令和4年3月15日																																																																			
作業内容			区分	令和3年6月						令和3年7月						令和3年8月						令和3年9月						令和3年10月						令和3年11月						令和3年12月						令和4年1月						令和4年2月						令和4年3月																													
				5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30																														
施工計画書作成			計画	総合・工種別(足場・配管・スリーブ)						工種別(ダクト)																								工種別(機器据付)						工種別(試運転)																																															
			実施	総合・工種別(足場・配管・スリーブ)						工種別(ダクト)																																																																													
施工図作成			計画	地中配管						1F天井内						2F天井内						3F天井内																																																																	
			実施	地中配管						1F天井内																																																																													
主要機器・材料手配			計画							機材メーカー選定(空調機・ボイラー)						機材承諾届(空調機・ボイラー)						製作期間																																																																	
			実施							機材メーカー選定(空調機・ボイラー)																																																																													
現場仮設工事			計画																																																																																				
			実施																																																																																				
墨出し・スリーブ			計画							基礎スリーブ						1F天井内						2F天井内						3F天井内																																																											
			実施							基礎スリーブ																																																																													
配管			計画													土間内						1F天井内						2F天井内						3F天井内						屋外埋設																																															
			実施													土間内																																																																							
ダクト			計画																			1F天井内						2F天井内						3F天井内																																																					
			実施																			1F天井内						2F天井内						3F天井内																																																					
配管試験			計画													土間配管						1F天井内						2F天井内						3F天井内						屋外埋設																																															
			実施																																																																																				
保温			計画																			1F天井内						2F天井内						3F天井内																																																					
			実施																																																																																				
機器・器具取付			計画																			1F天井内						2F天井内						3F天井内						屋外																																															
			実施																																																																																				
機器・器具の調整・試運転			計画																																																																																				
			実施																																																																																				
全体試運転調整			計画																																																																																				
			実施																																																																																				
社内検査			計画																																																																																				
			実施																																																																																				
監督員検査			計画																																																																																				
			実施																																																																																				
竣工			計画																																																																																				
			実施																																																																																				
法令に基づく申請・届出・検査等			計画							消防着工						給水・排水・ガス申請																														消防設置届						消防検査						給水・排水・ガス検査																													
			実施							消防着工						給水・排水・ガス申請																																																																							

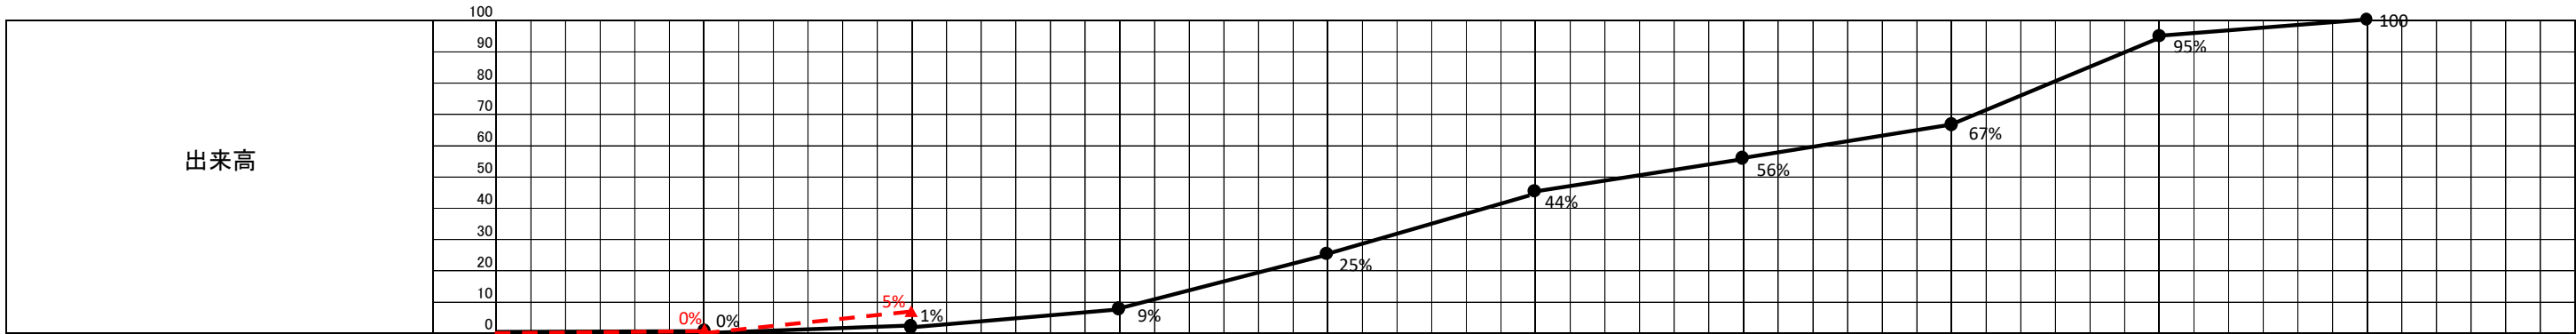

備 考	※法令等に基づく申請・届出・検査に関する予定を記入する。 ※工程線は、予定は実線(黒)、実施は実線(赤)で表す。 ※出来高線は、予定は実線(黒)、実施は破線(赤)で表す。	作成年月日	現場代理人
		令和3年8月1日	〇〇〇〇 株式会社 〇〇 〇〇
